
PROPUESTA DE DESARROLLO E INVERSIÓN

Base Operativa XANTRAX

Taller de inspección y metrología y depósito de herramientas de pozo

Parque Industrial Capital · Neuquén · Lote de 2.000 m²

XANTRAX S.R.L. · CUIT 30-71457180-6 · Proveedor Neuquino Certificado (Ley 3338) · Noviembre 2026

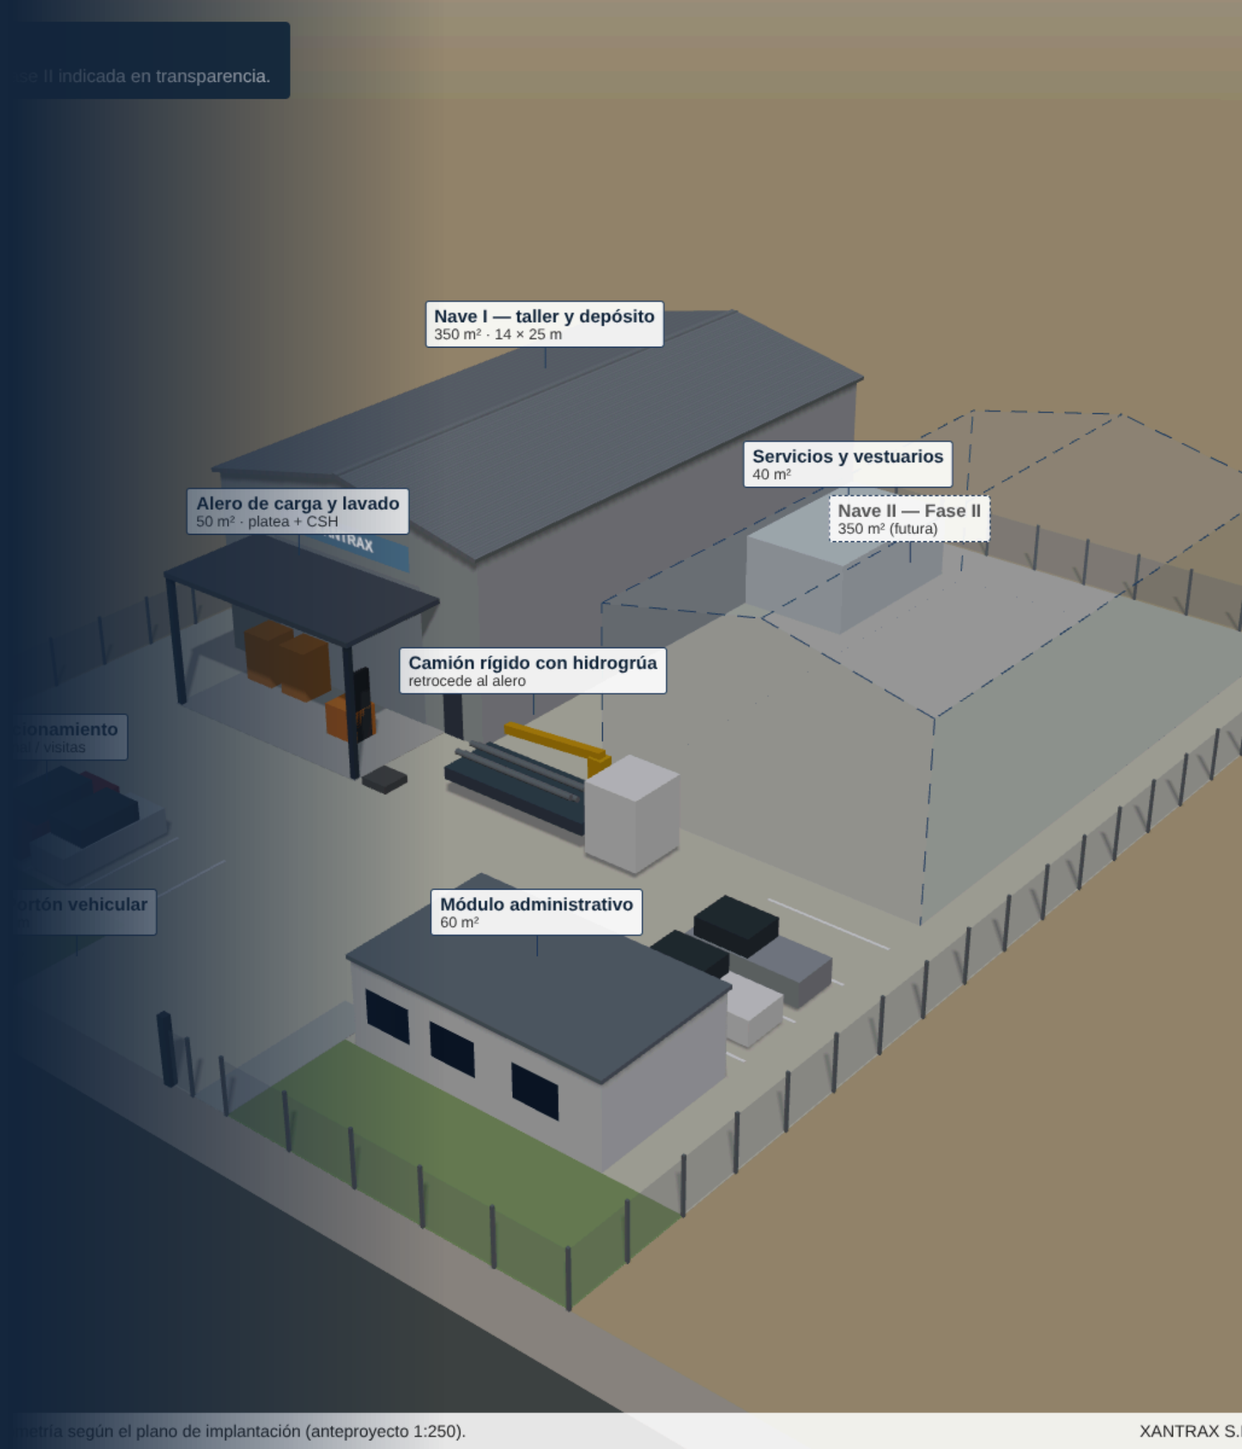

LA PROPUESTA EN CIFRAS

Una base operativa modular, en dos fases

$516 M
Inversión de la Fase I, en pesos

500 m²
A construir en la Fase I: 450 cubiertos y 50 semicubiertos

10
Empleos directos, más 6 indirectos y 18 en obra

2.000 m²
Lote solicitado, con reserva para la Fase II

EL PROPONENTE

XANTRAX S.R.L.: herramientas y servicios para pozos de la Cuenca Neuquina

Proveemos herramientas, insumos y servicios para la perforación, la terminación y la intervención de pozos de petróleo y gas, con foco en Vaca Muerta.

Proveedor Neuquino Certificado · Ley 3338 · Rango A

Herramientas de pesca

Recuperación de sartas y elementos caídos en el pozo

Corte y punzado

Herramientas mecánicas e hidráulicas para casing y tubing

Wireline y Slickline

Herramientas, insumos y accesorios para operaciones con cable

Mantenimiento e inspección

Control metrológico y prueba antes del envío a campo

PARA QUÉ ES LA BASE

Cada herramienta pasa por la base antes de volver al pozo

1

Recepción

Llega de campo vacía y descargada

2

Lavado

Bajo alero, con platea y separador

3

Inspección

Control metrológico trazable

4

Mantenimiento

Reparación y prueba hidrostática

5

Depósito

En racks, con registro por QR

6

Despacho

Envío a la locación de pozo

El proyecto reúne las seis etapas en un solo predio del Parque Industrial Capital.

EL PROYECTO

Desarrollo modular y progresivo, en dos fases

Fase I · Instalación inicial

- Nave taller y depósito de 350 m² (14 × 25 m)
- Módulo administrativo de 60 m²
- Módulo de servicios, vestuarios y comedor de 40 m²
- Alero de carga y lavado de 50 m²
- Playón, estacionamientos, cerco y portón de 8 m

Inversión declarada: $516 M

Fase II · Ampliación

- Segunda nave de 350 m² para acopio e inspección
- Monorriel o puente grúa de 3 a 5 t
- Autoelevador de 2,5 a 3 t
- Camioneta 4x4 para locaciones de pozo

Equipamiento estimado: $130 M, más la nave II

IMPLANTACIÓN

Un lote de 40 × 50 m ordenado para la logística

Nave abierta al playón

Portón de 8 m bajo el alero de carga y lavado

Administración junto al acceso


Separada del tránsito de camiones, con acceso peatonal propio

Maniobra resuelta dentro del lote

Camión rígido de hasta 10 m: entra de frente y retrocede al alero

Reserva para la Fase II

Ocupación del suelo (FOS) del 25 % en la Fase I y 42,5 % con la Fase II

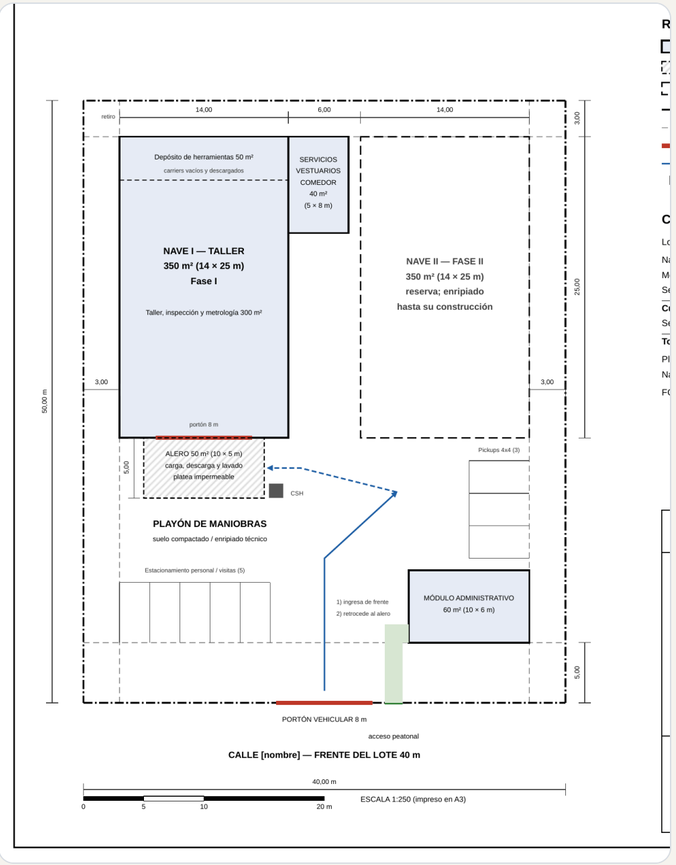

Plano de anteproyecto, escala 1:250. Retiros a verificar con el reglamento del PIC · 6

VISTAS DEL PROYECTO

La base en la Fase I y con la ampliación



Fase I: nave, alero, módulos y playón



Fase II: segunda nave de 350 m²

Imágenes ilustrativas, no son documentación técnica. Geometría según el plano de anteproyecto · 7

SUPERFICIES

500 m² a construir en la Fase I

Por tipo de superficie

Tipo	m²
Cubierta	450
Semicubierta (alero)	50
Total a construir	**500**
Descubierta / operativa	970

Superficie cubierta por sector

Sector	m²
Administración	60
Taller: inspección, metrología y mantenimiento	300
Depósito de herramientas	50
Servicios, vestuarios y comedor	40
Total cubierto	**450**

La superficie descubierta incluye playón, estacionamientos y la reserva de la Fase II

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Construcción industrial mixta y modular

Nave taller y depósito

Pórticos metálicos y chapa prepintada. Altura libre de 7 m o más, preparada para monorriel de 3 a 5 t. Piso de hormigón armado H30.

Módulos administrativo y de servicios

Módulos industriales de alta aislación térmica y montaje rápido, con aberturas de doble vidriado.

Alero de carga y lavado

Platea impermeable con pendiente y cámara separadora de hidrocarburos para el efluente de lavado.

Exterior

Playón compactado y enripiado, estacionamientos, cerco perimetral olímpico y portón vehicular de 8 m.

INVERSIÓN · FASE I

$516 M: 86 % en obra y 14 % en equipamiento

Infraestructura y obras

Concepto	Millones $
Nave taller y depósito 350 m²	245
Módulo administrativo 60 m²	42
Módulo de servicios 40 m²	28
Alero 50 m² con platea impermeable	18
Playón, cerco y portón	50
Servicios e instalaciones	38
Proyecto, dirección de obra, suelos y permisos	25
Subtotal obra	**446**

Equipamiento y bienes de capital

Concepto	Millones $
Banco de prueba y lavadora	32
Racks pesados	18
Taller y metrología	13
Informática y QR	7
Subtotal	**70**

$516 M

≈ USD 333.000 al dólar BNA de unos $1.550

Montos en pesos, Paso 3 de la DDJJ. Tipo de cambio a actualizar el día de la presentación · 10

CONTRASTE CON EL MERCADO

La nave está dentro del rango de mercado relevado en 2026

Rubro	Proyecto	Referencias de mercado 2026	Lectura
Nave, por m²	$700.000	$388.000 a $953.000; promedio ≈ $758.000	Dentro del rango, 8 % bajo el promedio
Módulos, por m²	$700.000	Avisos en Neuquén: $890.000 a $1.775.000	Bajo los avisos: se cotiza
Autoelevador	$45 M	USD 15.500 a 33.000 ≈ $24 M a $51 M	Dentro del rango (Fase II)
Camioneta 4x4	$55 M	Precio de lista: $57,8 M a $69,3 M	Bajo la lista: se ajusta (Fase II)
Resto de la Fase I	$201 M	Sin referencias publicadas confiables	Se cotiza

16 rubros con pedidos de cotización a proveedores para confirmar cada monto antes de la ejecución.

Fuentes: COPAIPA (ago. 2026), Revista Cifras / Tecnomateriales, EDICI (ago. 2026), presupuestodegalpon.ar; precios de lista Toyota Hilux 4x4 (jul. a sept. 2026); avisos de Mercado Libre. Dólar a $1.550.

EMPLEO

34 puestos de trabajo entre obra y operación

10 **puestos directos en operación**

Función	Personas
Administración y logística	2
Técnicos de inspección y metrología	3
Operarios de taller	3
Mantenimiento y depósito	1
Profesional (ingeniería y seguridad e higiene)	1

6

puestos indirectos: seguridad, transporte, limpieza y asesoría

18

trabajadores temporales durante la obra y el montaje

≥ 70 %

del personal directo con residencia en Neuquén

SEGURIDAD Y AMBIENTE

En el predio no hay explosivos ni fuentes radiactivas

Material energético fuera del ejido

Se opera desde polvorines de terceros habilitados por ANMAC. XANTRAX tiene inscripción propia.

Transporte habilitado y tercerizado

Vehículos de mercancías peligrosas Clase 1 que no ingresan ni estacionan en la base.

Herramientas vacías y verificadas

Los carriers ingresan descargados, con registro escrito de inspección en origen.


Lavado sin vuelco de efluentes

Platea impermeable, cámara separadora de hidrocarburos y protección contra incendio.

Detalle en el anexo: Declaración Jurada de exclusión de materiales energéticos y radiactivos · 13

CRONOGRAMA

Fase I en operación a los 12 meses de la posesión

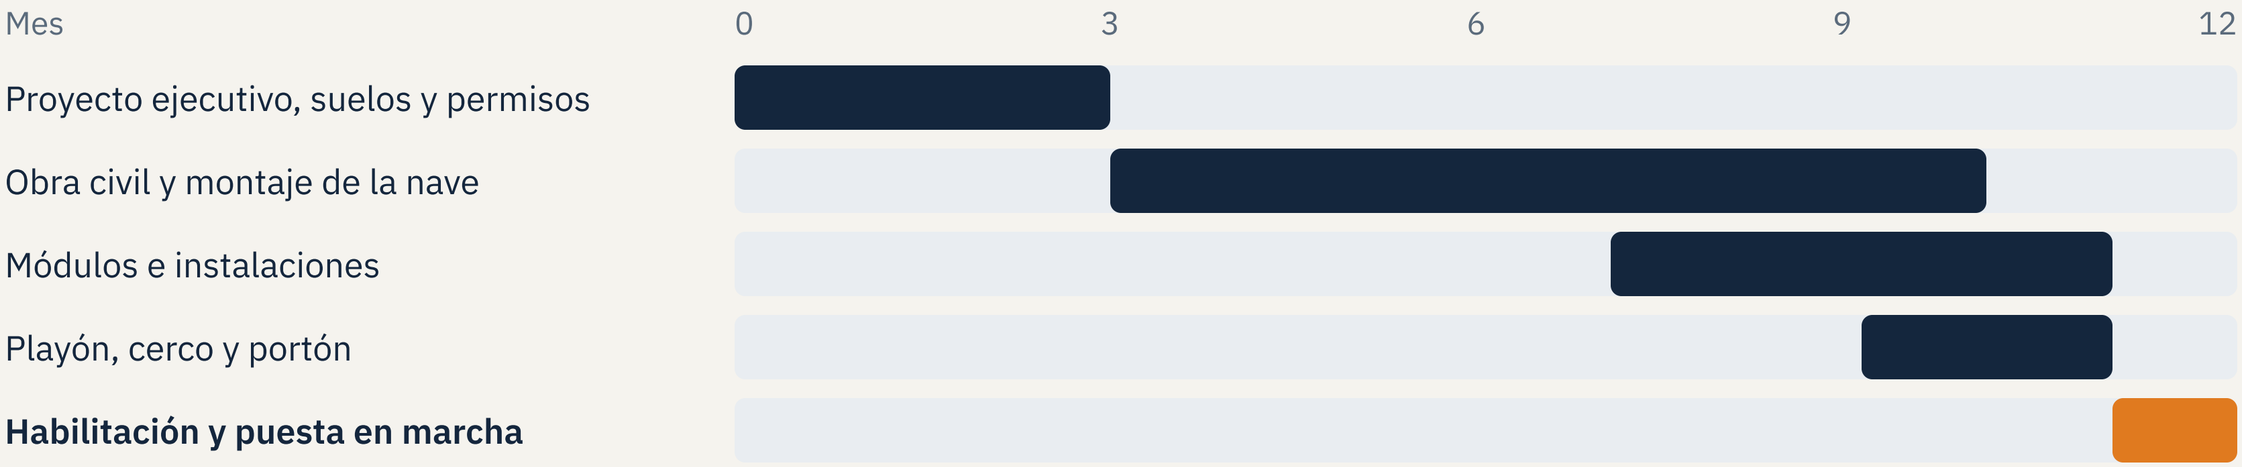

Fase II: segunda nave y equipamiento de izaje en [fecha] o al cumplirse [indicador: facturación o equipos en servicio].

APORTE AL PARQUE INDUSTRIAL CAPITAL

Un proveedor neuquino de Vaca Muerta, radicado en la Capital

Cadena de valor local

Proveedor Neuquino Certificado (Ley 3338) del sector hidrocarburífero

Inversión comprometida

$516 M en la Fase I, con una segunda nave prevista

Empleo neuquino

34 puestos entre obra y operación, al menos 70 % residentes

Uso eficiente y seguro del suelo

Ocupación progresiva, sin explosivos y con efluentes controlados

Gracias

XANTRAX S.R.L.

[Nombre y apellido] · [Cargo]

[Teléfono] · [Correo]

www.xantrax.com.ar



Imagen ilustrativa · 16
