
PROPUESTA DE DESARROLLO E INVERSIÓN

Base Operativa XANTRAX

Taller de inspección y metrología y depósito de herramientas de pozo

Parque Industrial Capital · Neuquén · Lote de 2.000 m²

XANTRAX S.R.L. · CUIT 30-71457180-6 · Proveedor Neuquino Certificado (Ley 3338) · Noviembre 2026

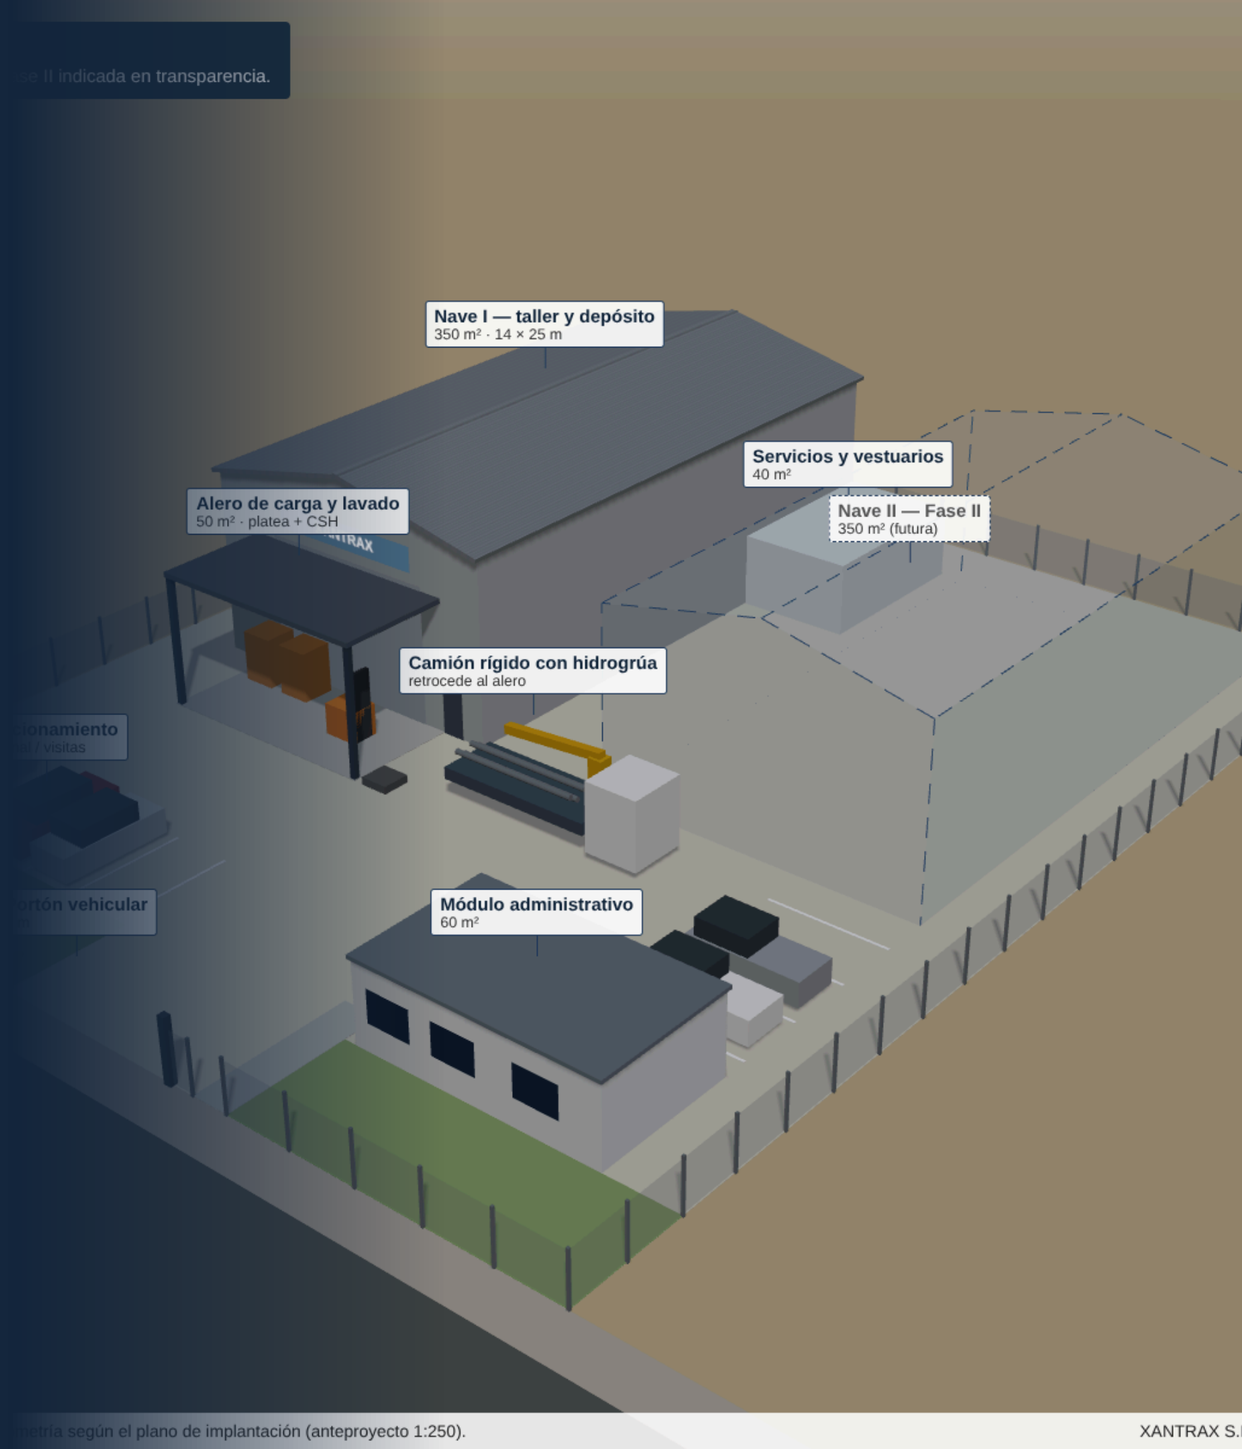

LA PROPUESTA EN CIFRAS

Una base operativa modular, en dos fases

$516 M
Inversión de la Fase I, en pesos

500 m²
A construir en la Fase I: 450 cubiertos y 50 semicubiertos

10
Empleos directos, más 6 indirectos y 18 en obra

2.000 m²
Lote solicitado, con reserva para la Fase II

EL PROPONENTE

XANTRAX S.R.L.: herramientas y servicios para pozos de la Cuenca Neuquina

Proveemos herramientas, insumos y servicios para la perforación, la terminación y la intervención de pozos de petróleo y gas, con foco en Vaca Muerta.

Proveedor Neuquino Certificado · Ley 3338 · Rango A

Herramientas de pesca

Recuperación de sartas y elementos caídos en el pozo

Corte y punzado

Herramientas mecánicas e hidráulicas para casing y tubing

Wireline y Slickline

Herramientas, insumos y accesorios para operaciones con cable

Mantenimiento e inspección

Control metrológico y prueba antes del envío a campo

PARA QUÉ ES LA BASE

Cada herramienta pasa por la base antes de volver al pozo

1

Recepción

Llega de campo vacía y descargada

2

Lavado

Bajo alero, con platea y separador

3

Inspección

Control metrológico trazable

4

Mantenimiento

Reparación y prueba hidrostática

5

Depósito

En racks, con registro por QR

6

Despacho

Envío a la locación de pozo

El proyecto reúne las seis etapas en un solo predio del Parque Industrial Capital.

EL PROYECTO

Desarrollo modular y progresivo, en dos fases

Fase I · Instalación inicial

- Nave taller y depósito de 350 m² (14 × 25 m)
- Módulo administrativo de 60 m²
- Módulo de servicios, vestuarios y comedor de 40 m²
- Alero de carga y lavado de 50 m²
- Playón, estacionamientos, cerco y portón de 8 m

Inversión declarada: $516 M

Fase II · Ampliación

- Segunda nave de 350 m² para acopio e inspección
- Monorriel o puente grúa de 3 a 5 t
- Autoelevador de 2,5 a 3 t
- Camioneta 4x4 para locaciones de pozo

Inicio previsto a los 36 meses, o antes si el depósito supera el 80 % de ocupación durante 6 meses

Equipamiento estimado: $130 M, más la nave II

IMPLANTACIÓN

Un lote de 40 × 50 m ordenado para la logística

Nave abierta al playón

Portón de 8 m bajo el alero de carga y lavado

Administración junto al acceso


Separada del tránsito de camiones, con acceso peatonal propio

Maniobra resuelta dentro del lote

Camión rígido de hasta 10 m: entra de frente y retrocede al alero

Reserva para la Fase II

Ocupación del suelo (FOS) del 25 % en la Fase I y 42,5 % con la Fase II

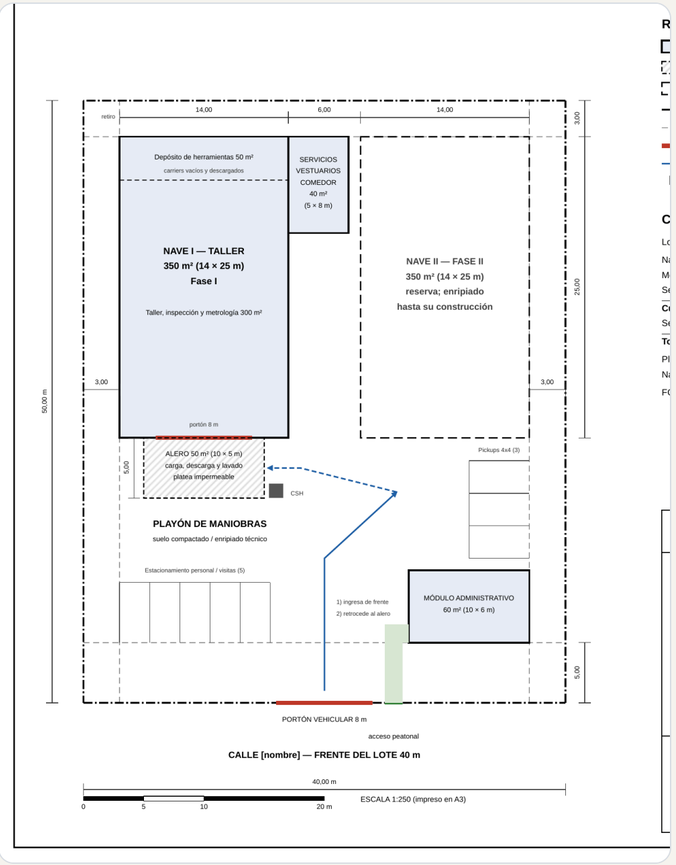

Plano de anteproyecto, escala 1:250. Retiros a verificar con el reglamento del PIC · 6

VISTAS DEL PROYECTO

La base en la Fase I y con la ampliación



Fase I: nave, alero, módulos y playón



Fase II: segunda nave de 350 m²

Imágenes ilustrativas, no son documentación técnica. Geometría según el plano de anteproyecto · 7

SUPERFICIES

500 m² a construir en la Fase I

Por tipo de superficie

Tipo	m²
Cubierta	450
Semicubierta (alero)	50
Total a construir	**500**
Descubierta / operativa	970

Superficie cubierta por sector

Sector	m²
Administración	60
Taller: inspección, metrología y mantenimiento	300
Depósito de herramientas	50
Servicios, vestuarios y comedor	40
Total cubierto	**450**

La superficie descubierta incluye playón, estacionamientos y la reserva de la Fase II

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Construcción industrial mixta y modular

Nave taller y depósito

Pórticos metálicos y chapa prepintada. Altura libre de 7 m o más, preparada para monorriel de 3 a 5 t. Piso de hormigón armado H30.

Módulos administrativo y de servicios

Módulos industriales de alta aislación térmica y montaje rápido, con aberturas de doble vidriado.

Alero de carga y lavado

Platea impermeable con pendiente y cámara separadora de hidrocarburos para el efluente de lavado.

Exterior

Playón compactado y enripiado, estacionamientos, cerco perimetral olímpico y portón vehicular de 8 m.

INVERSIÓN · FASE I

$516 M: 86 % en obra y 14 % en equipamiento

Infraestructura y obras

Concepto	Millones $
Nave taller y depósito 350 m²	245
Módulo administrativo 60 m²	42
Módulo de servicios 40 m²	28
Alero 50 m² con platea impermeable	18
Playón, cerco y portón	50
Servicios e instalaciones	38
Proyecto, dirección de obra, suelos y permisos	25
Subtotal obra	**446**

Equipamiento y bienes de capital

Concepto	Millones $
Banco de prueba y lavadora	32
Racks pesados	18
Taller y metrología	13
Informática y QR	7
Subtotal	**70**

$516 M

≈ USD 333.000 al dólar BNA de unos $1.550

Montos en pesos, Paso 3 de la DDJJ. Tipo de cambio a actualizar el día de la presentación · 10

CONTRASTE CON EL MERCADO

La nave está dentro del rango de mercado relevado en 2026

Rubro	Proyecto	Referencias de mercado 2026	Lectura
Nave, por m²	$700.000	$388.000 a $953.000; promedio ≈ $758.000	Dentro del rango, 8 % bajo el promedio
Módulos, por m²	$700.000	Avisos en Neuquén: $890.000 a $1.775.000	Bajo los avisos: se cotiza
Autoelevador	$45 M	USD 15.500 a 33.000 ≈ $24 M a $51 M	Dentro del rango (Fase II)
Camioneta 4x4	$55 M	Precio de lista: $57,8 M a $69,3 M	Bajo la lista: se ajusta (Fase II)
Resto de la Fase I	$201 M	Sin referencias publicadas confiables	Se cotiza

16 rubros con pedidos de cotización a proveedores para confirmar cada monto antes de la ejecución.

Fuentes: COPAIPA (ago. 2026), Revista Cifras / Tecnomateriales, EDICI (ago. 2026), presupuestodegalpon.ar; precios de lista Toyota Hilux 4x4 (jul. a sept. 2026); avisos de Mercado Libre. Dólar a $1.550.

EMPLEO

34 puestos de trabajo entre obra y operación

10 **puestos directos en operación**

Función	Personas
Administración y logística	2
Técnicos de inspección y metrología	3
Operarios de taller	3
Mantenimiento y depósito	1
Profesional (ingeniería y seguridad e higiene)	1

6

puestos indirectos: seguridad, transporte, limpieza y asesoría

18

trabajadores temporales durante la obra y el montaje

≥ 70 %

del personal directo con residencia en Neuquén

SEGURIDAD Y AMBIENTE

En el predio no hay explosivos ni fuentes radiactivas

Material energético fuera del ejido

Se opera desde polvorines de terceros habilitados por ANMAC. XANTRAX tiene inscripción propia.

Transporte habilitado y tercerizado

Vehículos de mercancías peligrosas Clase 1 que no ingresan ni estacionan en la base.

Herramientas vacías y verificadas

Los carriers ingresan descargados, con registro escrito de inspección en origen.


Lavado sin vuelco de efluentes

Platea impermeable, cámara separadora de hidrocarburos y protección contra incendio.

Detalle en el anexo: Declaración Jurada de exclusión de materiales energéticos y radiactivos · 13

CRONOGRAMA

Fase I en operación a los 12 meses de la posesión

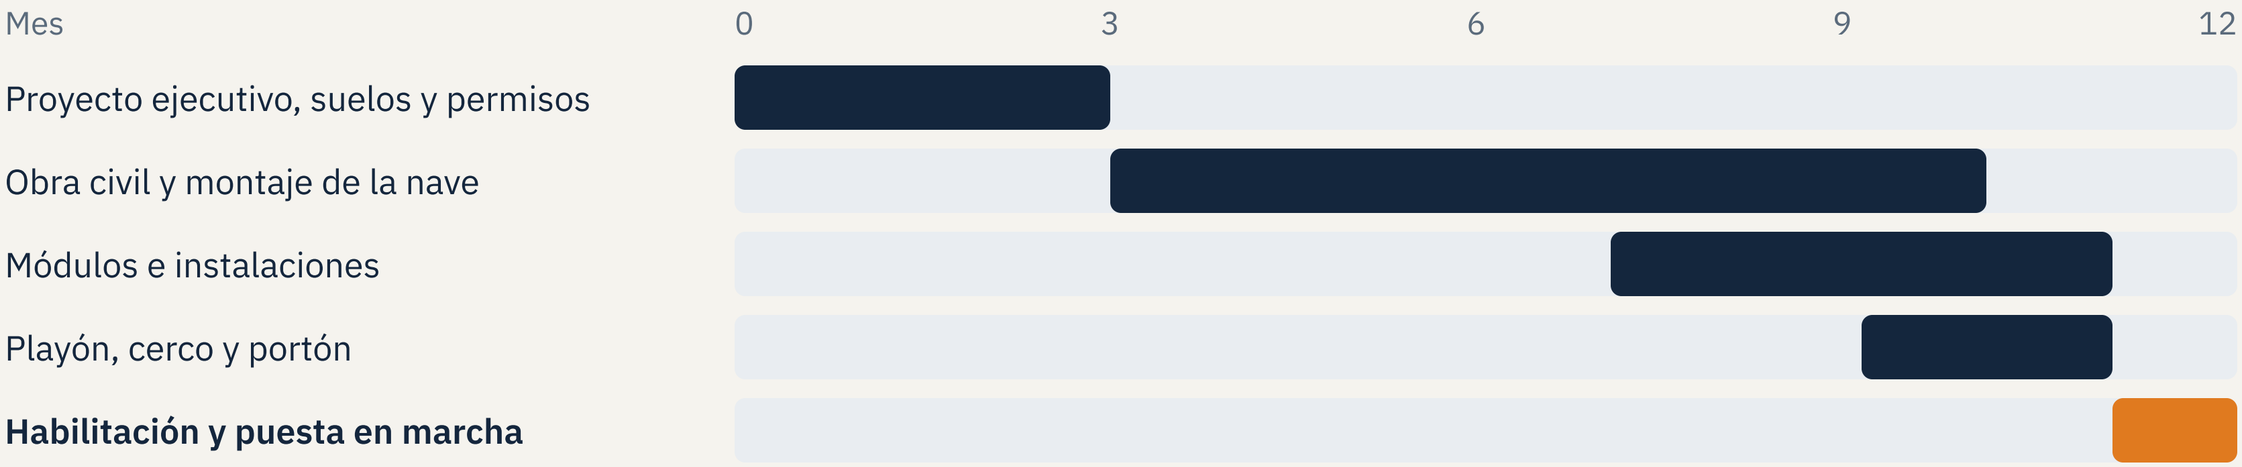

Fase II: inicio previsto a los 36 meses de la posesión, o antes si la ocupación del depósito supera el 80 % durante 6 meses seguidos.

APORTE AL PARQUE INDUSTRIAL CAPITAL

Un proveedor neuquino de Vaca Muerta, radicado en la Capital

Cadena de valor local

Proveedor Neuquino Certificado (Ley 3338) del sector hidrocarburífero

Inversión comprometida

$516 M en la Fase I, con una segunda nave prevista

Empleo neuquino

34 puestos entre obra y operación, al menos 70 % residentes

Uso eficiente y seguro del suelo

Ocupación progresiva, sin explosivos y con efluentes controlados

Gracias

XANTRAX S.R.L.

[Nombre y apellido] · [Cargo]

[Teléfono] · [Correo]

www.xantrax.com.ar



Imagen ilustrativa · 16
